


# Checkliste Bau



## I) Arbeiten auf dem Dach - Absturzgefahr

- Dachfanggerüst vorhanden
- Schutznetz nach innen vorhanden
- Tragfähigkeit Dach gewährleistet (Asbestplatten!)
- Zuständigkeit für Absturzsicherung:
  - Bauherr
  - Firma .....
- Ein Dachfanggerüst/Netz wird nicht montiert, weil.....
- .....

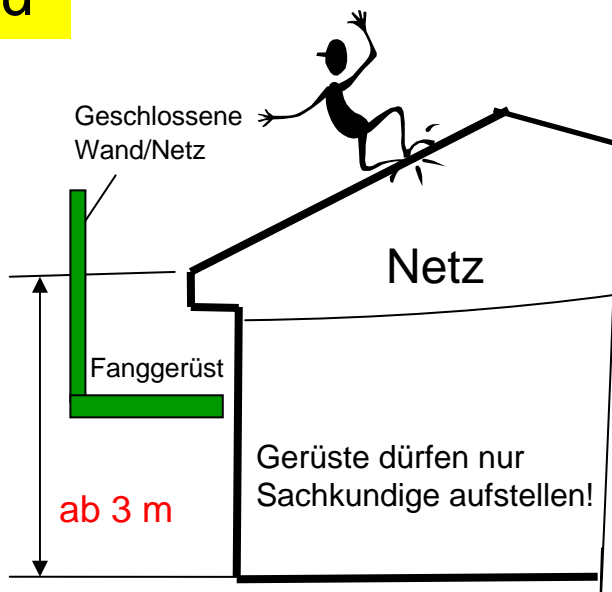

## II) Baugruben – Gefahr des Verschüttens/Absturzes

- senkrechte Wände bis max. 1,25 m tief
- 45 Grad bei Kies
- 60 Grad bei Lehm
- 80 Grad bei Fels
- Abstände zur Baugrube eingehalten ( 1m bei 12 t Gesamtgewicht – 2m bei größer 12 t)
- Zugänge zur Baugrube vorhanden
  - Tragfähigkeit ausreichend
  - Geländer vorhanden

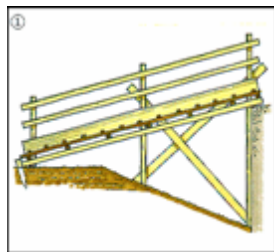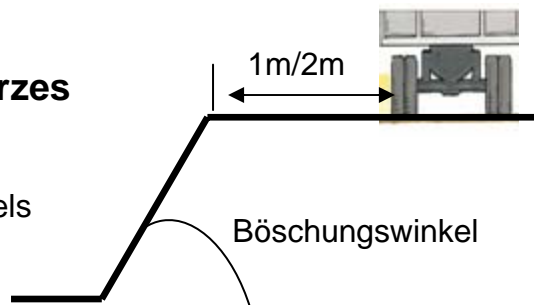

## III) Persönliche Schutzausrüstung

- Helm, wenn mit herabfallenden Gegenständen zu rechnen ist
- Sicherheitsschuhe mit durchtrittssicherer Sohle (S3)
- Handschuhe
- Gehörschutz
- Atemschutz (P2-Masken) – Vorsicht: Asbestarbeiten nur durch Sachkundige

**Bitte melden Sie Ihre Baustelle  
bei der Berufsgenossenschaft an - Meldepflicht**
